

11865-37/2010.

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

név: **Csopak Község Önkormányzata  
Polgármesteri Hivatal**  
cím: 8229, Csopak, Petőfi Sándor utca 2.  
adóigazgatási szám: 15428701-2-19  
bankszámlaszám: 11748069-15428701-10120006  
képviseli: Ambrus Tibor polgármester, Dr. Szántód Anita jegyző

továbbiakban mint **Megrendelő**

másrészről

név: **Hornyák Szállítási és Szolgáltató Kft.**  
cím: 2890 Tata, Faller Jenő úti Ipartelep 2158/59.  
KSH. szám: 11185417-4941-113-11  
adóigazgatási szám: 111854-17-2-11  
bankszámlaszám: 10103623-46922300-01000007  
képviselik: Hornyák Csaba ügyvezető

továbbiakban mint **Vállalkozó**, együttes említés esetén **Felek**

között a mai napon és helyen az alábbiak szerint:

### **1. Szerződés tárgya:**

- 1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi létesítmény jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel a rendelkezésre bocsátott tervdokumentációk I. osztályú minőségben történő teljeskörű megvalósítását:

**„A kerékpárosbarát település” KDOP 2.1.1/D-09-2009-0007 sz. projekt  
kivitelezése**

**1. részfeladat: kerékpárút kivitelezése**



## 2. Vállalkozás díja:

Az 1. pontban körülírt munka vállalkozási díja:

1. Nettó díjvállalási ár:	.....32.149.133,- Ft
2. +3% tartalékkeret:	.....964.474,- Ft
Nettó ajánlati ár összesen (1.+2.):	.....33.113.607,- Ft
25% ÁFA:	.....8.278.402,- Ft
<b>Bruttó ajánlati ár összesen:</b>	<b>.....41.392.009,- Ft</b>

azaz: Negyvenegymillió-háromszázkilencvenkettőezer-kilenc forint.

- 2.1. Fenti összeg rögzített egységáron, a befejezési határidőre prognosztizált fix összegű átalányár, mely fedezetet nyújt Vállalkozónak az 1. pontban meghatározott és az Ajánlattételi dokumentációban részletezett műszaki tartalmú munkákkal összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségére, ezért Vállalkozó a létesítmény megvalósítása során a dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség igényt Megrendelő felé jelen szerződés megkötését követően nem emelhet.
- 2.2. A szerződéses összeg tartalmazza a létesítmény rendeltetésszerű használatához szükséges, Megrendelő által írásban elrendelt pótmunkák költségvonzatát, melyek elvégzésére – tételes elszámolás mellett – a tartalékkeret biztosít fedezetet. A tartalékkeret felhasználására csak Megrendelő előzetes, írásos elrendelése alapján kerülhet sor.
- 2.3. Megrendelő és a Vállalkozó együttesen megállapítják, hogy a jelen szerződésben felsorolt munkák amennyiben az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) b) pontjának hatálya alá tartoznak, azaz olyan építési-szerelési munkák, amelyek ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányulnak, és építési hatósági engedély-kötelesek, akkor erről Megrendelő jelen szerződésben tájékoztatta a Vállalkozót. Fentieknek megfelelően a fordított adózás szabályai szerint kell eljárni, számlázni és a bevallásokat elkészíteni. Ennek értelmében Vállalkozó által kiállított számla nem tartalmazhat Általános Forgalmi Adót, azt Megrendelőnek kell bevallani és megfizetni.

## 3. Határidők:

3.1. A munkaterület átadásának határideje: **szerződéskötés napján**

3.2. A kivitelezés befejezési határideje: **2010. szeptember 09.**

3.3. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó – Megrendelővel előzetes jóváhagyásával – a szerződésben foglalt határidők (véghatáridő) előtt is jogosult teljesíteni. Az előteljesítés nem jelenti automatikusan az előrehozott számlázás lehetőségét, illetőleg a Vállalkozó által kiállított számla fizetési határideje a tervezett teljesítési határidő alapján számított fizetési határidőt nem előzheti meg.

#### **4. Műszaki feltételek**

4.1. Vállalkozó a 290/2007. (X. 31.) Kormány rendelet alapján a kivitelezés megkezdésekor Építési naplót nyit, mely tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére vonatkozó, vagy az elszámoláshoz szükséges tényeket, változásokat. Az Építési napló vezetése naponta és folyamatosan kell, hogy történjen egészen az építés befejezéséig. Vállalkozó köteles az Építési naplót az illetékes személyek – Megrendelő és megbízott műszaki ellenőre, valamint a tervezők számára – mindenkor hozzáférhető helyen az építési területen tartani.

#### **Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:**

Megrendelő részéről

cím: Ambrus Tibor polgármester  
Tel/Fax: 87/446-250  
E-mail: polgarmester@csopak.hu

cím:  
Tel/Fax:  
E-mail:

Vállalkozó részéről:

Dénes Zoltán  
cím: 8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 12.  
Tel/Fax: 88/561-147, 88/561-148  
E-mail: hornyak.veszprem@invitel.hu

4.2. Megrendelő műszaki ellenőre személyét és elérhetőségét a munkaterület átadásakor a munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíti.

4.3. Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni (Ptk. 404. § (1) bek.).

A Megrendelő feladatát képezi továbbá a munkahely munkavédelmi előírásoknak megfelelő állapotának biztosítása az átadás időpontjára.

A munkaterület átadását Megrendelő kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről.

4.4. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt egészen a műszaki átadás-átvétel lezárúltáig a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok



betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezéséről.

A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel lezárultának időpontjáig Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszközök, berendezések és anyagok tárolását és őrzését, az élet- és vagyonbiztonságot. Vállalkozó felelőssége kiterjed alvállalkozóira és szállítóira is.

Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat, esetleges korlátozó intézkedéseket, amelyeket Megrendelő írásban határoz meg számára a munkaterület átadás-átvételi eljárása során.

A munkaterület állapot rögzítése átvételkor a Vállalkozó feladata.

- 4.5. Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként az Építési naplóban rögzíteni.

Felek rögzítik, hogy jelen Vállalkozási szerződésben rögzítettek módosítása (pl: határidők, összegek, stb.) az Építési Naplóba történő bejegyzéssel semmilyen formában nem hajtható végre, azt külön szerződésmódosítás keretében – a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével – lehet megtenni.

- 4.6. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelőnek bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (8 naptári nappal korábban) vagy írásban (3 munkanappal korábban) értesíteni.

Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

- 4.7. A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében, vagy azok elhárításában – szükség szerint – köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában.

- 4.8. Az esetlegesen nem jelzett közművek kiváltása, az ehhez szükséges engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata.

- 4.9. Megrendelő a szerződéskötést követően előre nem látható okból bekövetkezett körülmény miatt a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a változás következményeit a befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell vennie, s szükség szerint – a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével – jelen szerződést Feleknek írásban módosítaniuk kell.

- 4.10. A Megrendelő által elrendelt pótmunkákat Vállalkozó az előzetes áregyeztetést követően a tartalékkeret erejéig szerződésmódosítás nélkül elvégezheti. Az ezen érték feletti pótmunkák csak írásbeli szerződésmódosítás után, előzetes ármegállapodás szerint végezhetők.

Felek rögzítik, hogy pótmunkán azon munkarészt értik, mely sem az ajánlat alapját képező tervekben és engedélyekben, sem a költségvetésben nem szerepel. Felek megállapodnak, hogy pótmunkát csak és kizárólag Megrendelő írásban rendelhet el.

Megrendelő a többletmunkák érvényesítésének lehetőségét kizárja.

4.11. A műszaki tervekben előírányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetéről Felek külön írásos megállapodása szükséges.

Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyártó és forgalmazó vállalatokról a minőségi tanúsítványt beszerezni és azokat az építési naplóhoz csatolni. Külföldi anyag és szerkezet felhasználása esetén a Vállalkozó tartozik a nemzeti szabvány szerinti minőséget saját költségén bizonyítani. Az ő kötelessége szükség esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos minőségi vizsgálatok elvégeztetése, a termék minősítése.

Beépítésre csak Magyarországon minősített, érvényes szabványoknak és az ajánlatban meghatározott műszaki feltételeket biztosító megfelelő I. osztályú anyagok és termékek használhatók.

4.12. A Vállalkozó által a Szerződés teljesítéséhez felhasznált összes anyagnak, berendezésnek és árunak olyannak kell lennie, amely számára a Kbt. 1. § (3) ill. 88. § (3) bekezdése értelmében nemzeti elbánást kell nyújtani.

4.13. Vállalkozó jogosult az ajánlati ár 10%-át meg nem haladó mértékben Alvállalkozót bevonni a kivitelezésbe, az alvállalkozó tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett.

4.14. Vállalkozó a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti. Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségtérítése mellett végeztet.

4.15. A munka minőségének meghatározására az építési engedély kiadásának időpontjában hatályos jogszabályok és az érvényben lévő műszaki specifikációk (nemzeti szabványok) előírásai szolgálnak.

4.16. Vállalkozó munkavégzése során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. szennyeződésekre a környezet és vízminőség védelemre vonatkozó előírásokat betartja, a munkaterületről a munkájával okozott szemetet, port, szennyeződést folyamatosan eltávolítja. Amennyiben ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti.

4.17. Vállalkozó a munkaterület átadást követően 3 munkanapon belül – az általa végzendő munkákról napi bontású műszaki ütemtervet és forgalomkorlátozási tervet készít, és azokat Megrendelővel jóváhagyatja.

4.18. Vállalkozó feladata munkaterületének, valamint az általa igénybevett közterületnek (járda, úttest stb.) folyamatos tisztán tartása, az építési területről közterületre kihordott sár, sirt folyamatos takarítása porszennyezés, a közterület külső csatornarendszer eldugítása nélkül, a hulladék, szemet és sirt munkaterületről történő folyamatos elszállítása. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó kötelezett. A műszaki átadás átvételi



dokumentációnak tartalmaznia kell az elszállított hulladék kezelői, illetve befogadói nyilatkozatait.

- 4.19. Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében köteles Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívni.
- 4.20. Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságának garantálására, az esetlegesen okozott károk helyreállítására. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel, költségátvállalás mellett felel.

## **5. Pénzügyi feltételek**

- 5.1. Megrendelő előleget biztosít Vállalkozó részére, az ajánlati ár min. 10%-nak de legfeljebb az ajánlati ár 11%-ának megfelelő összegben. (nyilatkozat alapján)
- 5.2. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel időpontjáig köteles 2.000.000,-HUF összegű teljesítési biztosítékot nyújtani, amely teljesíthető az Önkormányzat számlaszámára való befizetéssel, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényel nyújtani a Megrendelőnek.
- 5.3. A Vállalkozó köteles a sikeres műszaki átadás-átvételtől a szerződés szerinti jótállási időszak végéig a 1.000.000,-HUF összegű jótállási biztosítékot nyújtani, amely teljesíthető az Önkormányzat számlaszámára való befizetéssel, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényel nyújtani a Megrendelőnek.
- 5.4. Az 1. részszámla (előlegszámla) benyújtására, akkor van lehetőség, amennyiben a nyertes ajánlattevő az ajánlatát, ennek figyelembevételével adta meg. A végszámla benyújtására a hiánymentes teljesítés után a műszaki átadási- átvételi jegyzőkönyv birtokában van lehetőség. A szerződés szerint hiány- és hibamentes teljesítést követően kiállított és igazolt számlát 30 napos átutalási határidővel egyenlíti ki a Kbt. 305. § (3) bekezdésére figyelemmel.
- 5.5. A 2003. évi XCII. Törvény 36/A. § (1) bekezdésében előírtakra való tekintettel a havonta nettó módon számított 200.000,-Ft-ot meghaladó számlák befogadására a Vállalkozónak történő kifizetés előtt 30 napnál nem régebbi együttes adóigazolást illetve APEH honlapjáról internetes adatbázisból lehívható igazolást kell bemutatnia a Megrendelő részére.
- 5.6. Megrendelő az elkészült és felmérési naplóban igazolt pótmunkákat a végszámlával együtt – az előző pontban ismertetett módon – köteles kifizetni.
- A Vállalkozó a pótmunka elszámolása során nem alkalmazhat magasabb díjtételeket, és anyagárakat, mint amelyeket az árajánlatában megadott. Vállalkozó köteles a pótmunkák díját Megrendelővel előzetesen egyeztetni.
- 5.7. Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést – nem Vállalkozónak felróható okok miatt – le kell állítani, vagy azt




30 naptári napon túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi leigazolt teljesítményét soron kívül leszámlázni.

- 5.8. Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér címén a nettó ajánlati ár 0,2%-át köteles megfizetni minden késedelmesen eltelt nap után a Megrendelőnek. A kötbér a Megrendelő általi ellenszámla kibocsátással érvényesíthető.
- 5.9. Vállalkozó nem teljesítése esetén Megrendelő a kötbért meghaladó kártérítési igényét is érvényesítheti Vállalkozóval szemben.
- 5.10. A meghússulási kötbér a nettó ajánlati ár 5%-a.
- 5.11. Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy a Kbt. alapján a 22. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérőnek minősül, ezért a 305. § (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesülésének esetén alkalmazható és hozzájárul a pénzforgalmi szolgáltatójához adott beszédési megbízás teljesítéséhez.

## **6. Átadás-átvétel**

- 6.1. A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó műszaki átadás-átvételi eljárást kezdeményez, melyről Megrendelőt a kitűzött időpont előtt 5 munkanappal köteles értesíteni. Az eljárás során a Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyvben tett nyilatkozatával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést.
- 6.2. A műszaki átadás-átvétel feltétele a hiánymentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas létesítmény elkészítése. A műszaki teljesítés a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárásával, a szerződés teljesítése a használatbavétel feltételeinek biztosításával zárul.
- 6.3. Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, és a hiánytalanul, I. osztályú minőségben, használatba vételre és üzemeltetésre alkalmas állapotban elkészült létesítmények átvétele.
- 6.4. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.
- 6.5. Vállalkozó kötelezettsége az Alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás.
- 6.6. Vállalkozónak 3 munkanappal műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt a Megrendelő részére szolgáltatnia kell a létesítmény átadási dokumentációját 3 példányban, benne a megvalósulási tervet, a geodéziai bemérést, a hulladék nyilvántartási lapot, a vállalkozó megfelelőségi nyilatkozatát, minősítési javaslatát, a beépített anyagok és szerkezetek megfelelőség igazolásait, minőségi tanúsítványait (3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint), mérési jegyzőkönyveket és szabványossági nyilatkozatokat, nyomáspróba és egyéb vizsgálati jegyzőkönyveket, valamint a felelős kivitelezői (műszaki vezetői) nyilatkozatokat melyekben rögzítésre kerül, hogy Vállalkozó a munkát az engedélyezett tervek és a szerződésben foglaltak szerint teljesítette.



## **7. Szavatosság és jótállás**


- 7.1. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától kezdődik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett – és azokat a további építési munkálatok nem érintették – a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes.
- 7.2. Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozója által végzett munka minőségéért.
- 7.3. Vállalkozó az általa vagy Alvállalkozói által kivitelezett létesítményekre, illetve létesítményrészekre 60 hónap jótállási (garanciális) időtartamot vállal. A Vállalkozó az általa vagy Alvállalkozói által kivitelezett új létesítményre illetve létesítményrészekre a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet, illetve a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja.
- 7.4. Megrendelő tartozik a jótállási idő alatt fellépő hibákat a Vállalkozónak haladéktalanul, de legkésőbb a 60 hónap jótállási (garanciális) idő lejártáig a Vállalkozó tudomására hozni. A Vállalkozó tartozik a hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni a kijavítás, illetve a csere érdekében. Amennyiben a kijavítást vagy a cserét a bejelentéstől számított 30 napon belül nem végzi el Vállalkozó, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére azt más kivitelezővel elvégeztetni, és annak igényelt költségét – Megrendelő mérlegelése alapján – a jótállási biztosíték terhére lehívni.

## **8. Különleges szerződéses feltételek**

- 8.1. Ha a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, akkor Megrendelő jogosult az erről való tudomásszerzést követően, a munkák szakértővel való felmérésére és a munkáknak – a Vállalkozó költségére történő – haladéktalan továbbadására egy másik Vállalkozó felé.
- 8.2. Szerződő Felek a szerződés alapidokumentumaiként az Ajánlattételi dokumentációt, a Vállalkozó Ajánlatát, valamint a közbeszerzési eljárás ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentumot tekintik.
- 8.3. Szerződő Felek a 8.2. pont alatt felsorolt, valamint a Vállalkozási szerződésben foglaltakon túl, az alább felsorolt mellékletekben rögzített feltételekben állapodnak meg. A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, azzal együtt kezelendők, a szerződés csak ezen dokumentumokkal együtt érvényes.

1. sz. melléklet **Vállalkozó ajánlata**

2. sz. melléklet **Műszaki- és pénzügyi ütemterv**






## 9. Záró rendelkezések

- 9.1. A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.
- 9.2. A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a Felek között békés úton nem rendezett vitás ügyében az illetékes Veszprém Városi Bíróság – hatáskör hiányában – a Veszprém Megyei Bíróság jár el.
- 9.3. Szerződő Felek kijelentik, hogy a fenti, egymással szó szerint egyező, 4 példányban készült Vállalkozási szerződést elolvasták, annak tartalmát részükre megmagyarázták és azt megértették, majd a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Kelt: Veszprém 2010. 09 hó 01. nap



**Megrendelő**






**Vállalkozó**  
**HORNYÁK**  
Szállítási és Szolgáltató Kft.  
8200 Veszprém, Bajcsy Zs. u. 12.  
Adószám: 11185417-2-11

- 1 -



HLC

014

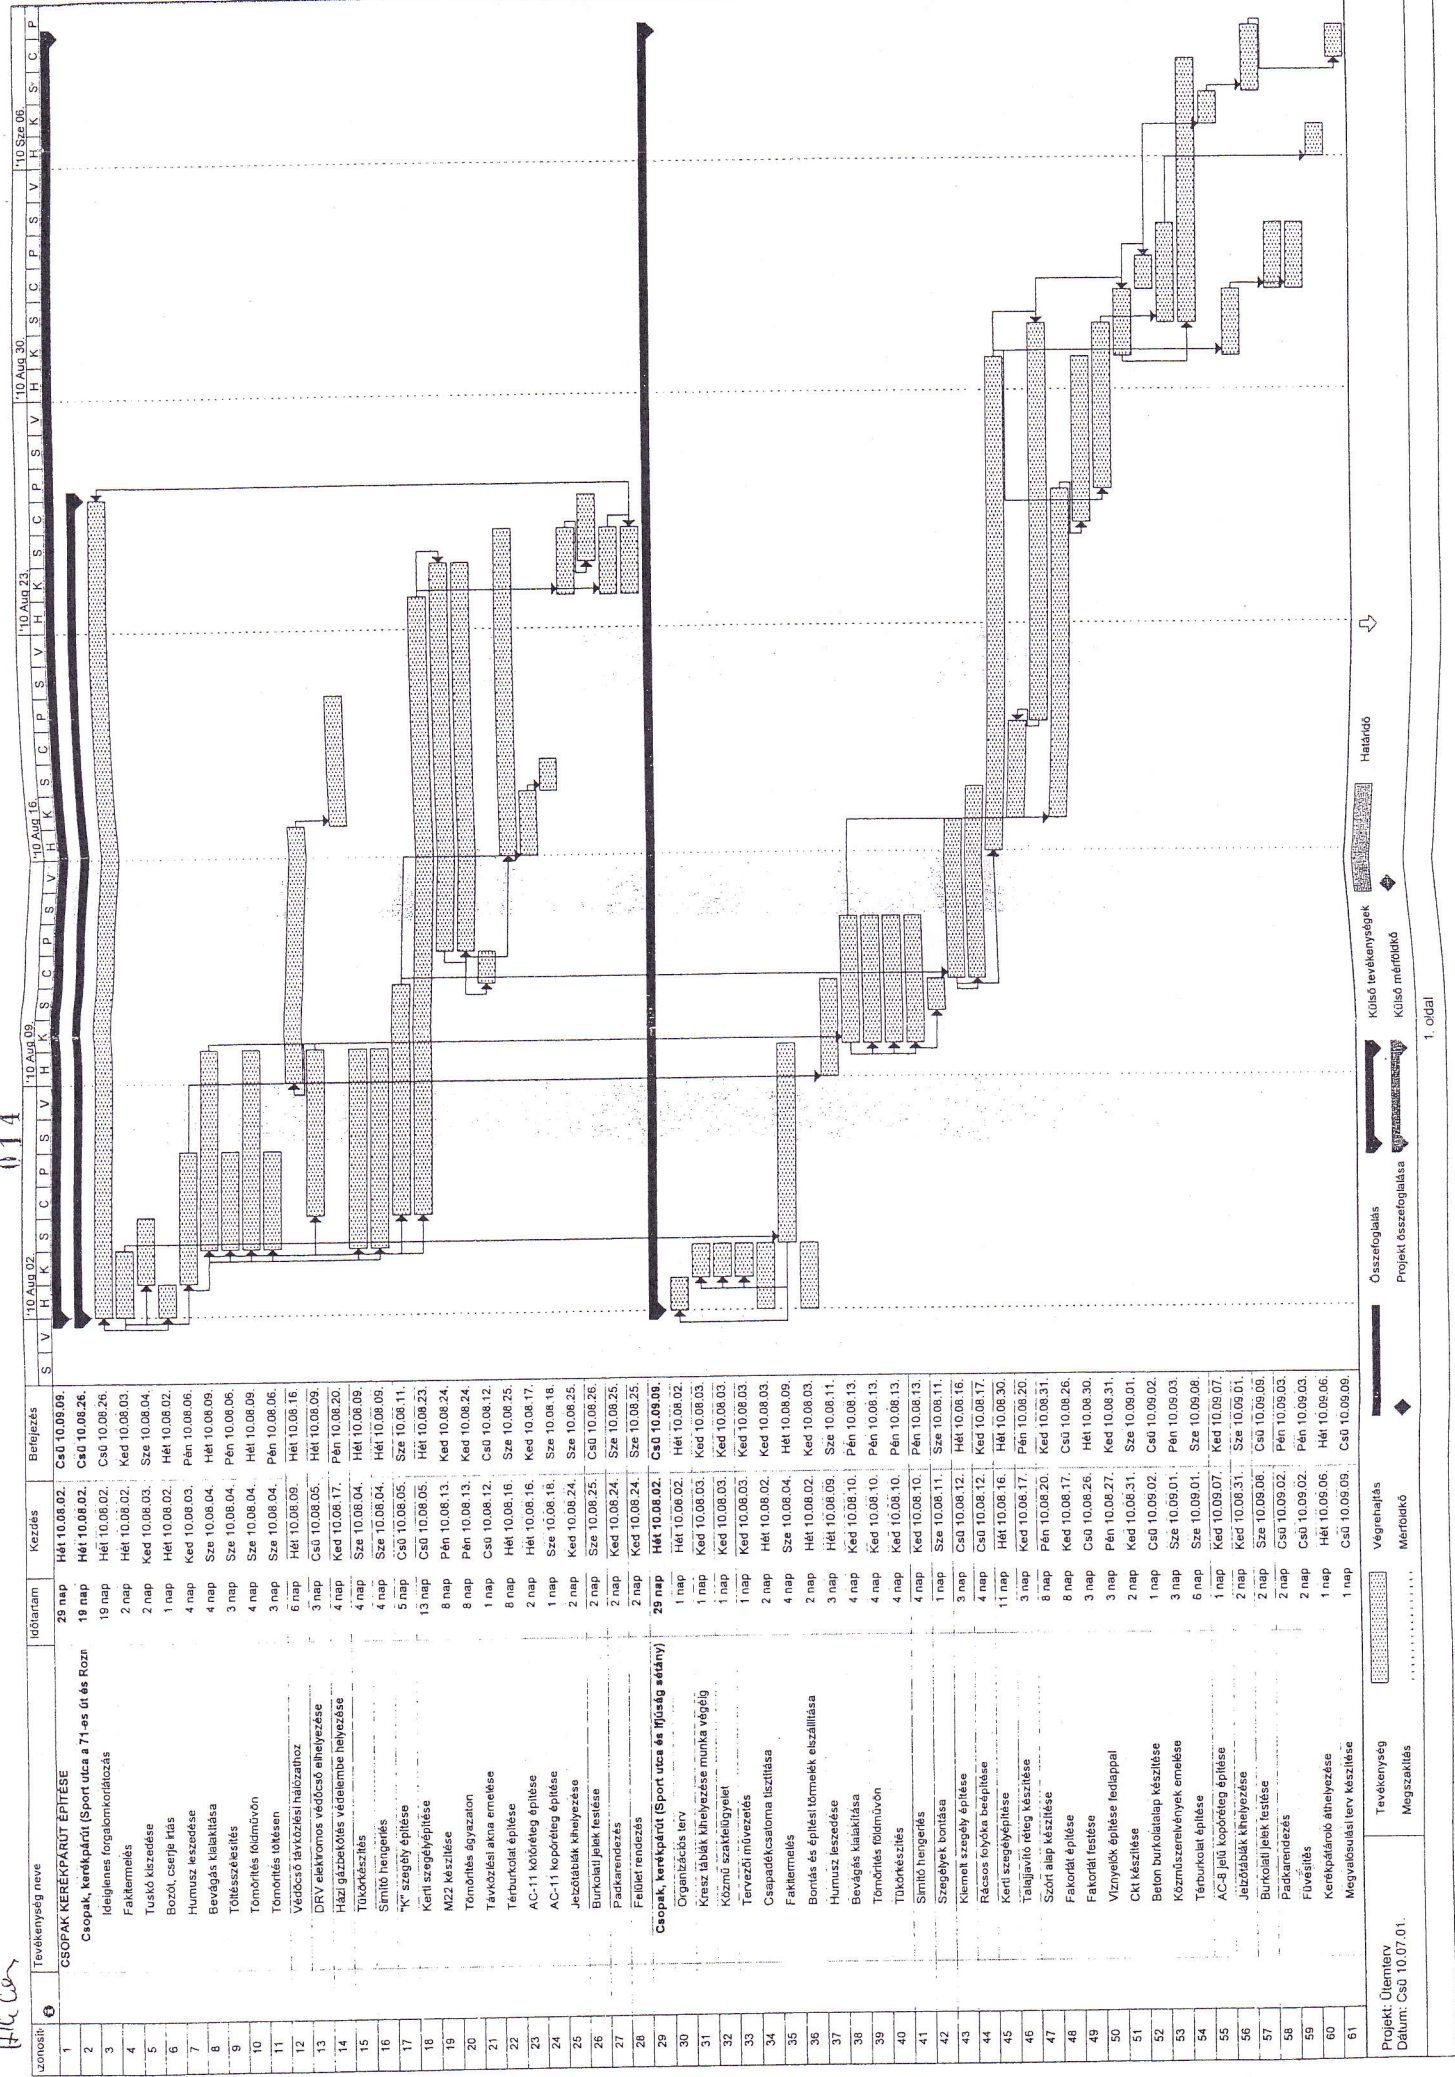

Sorszám	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés
1	C SOPAK KERÉKPÁRUT ÉPÍTÉSE	29 nap	Hét 10.08.02.	Csü 10.09.09.
2	Ceopak, kerékpárút (Sport utca a 71-as út és Rozn	19 nap	Hét 10.08.02.	Csü 10.08.26.
3	Időigényes forgalomkorlátozás	19 nap	Hét 10.08.02.	Csü 10.08.26.
4	Fakttermelés	2 nap	Hét 10.08.02.	Ked 10.08.03.
5	Tuskó kiszévedése	1 nap	Hét 10.08.02.	Hét 10.08.02.
6	Borító, cserje fűtés	4 nap	Ked 10.08.03.	Pén 10.08.06.
7	Humusz lezáródása	4 nap	Sze 10.08.04.	Hét 10.08.09.
8	Bevágás kialakítása	3 nap	Sze 10.08.04.	Pén 10.08.05.
9	Töltésszelés	4 nap	Sze 10.08.04.	Hét 10.08.09.
10	Tomortítés földművön	3 nap	Sze 10.08.04.	Hét 10.08.06.
11	Tomortítás oldáson	6 nap	Hét 10.08.16.	Hét 10.08.23.
12	Verdőső levelezési hálózathoz	3 nap	Csü 10.08.05.	Hét 10.08.09.
13	DRV elektronos védőső elhelyezése	4 nap	Ked 10.08.17.	Pén 10.08.20.
14	Házi gázbekötés védelme elhelyezése	4 nap	Sze 10.08.04.	Hét 10.08.09.
15	Tűkorkasztás	4 nap	Sze 10.08.04.	Hét 10.08.09.
16	Símtó hengertés	5 nap	Csü 10.08.05.	Sze 10.08.11.
17	"K" szegély építése	13 nap	Csü 10.08.05.	Hét 10.08.23.
18	Kerítiszegélyépítése	8 nap	Pén 10.08.13.	Ked 10.08.24.
19	M22 készítése	8 nap	Csü 10.08.12.	Csü 10.08.24.
20	Tomortítás ágyazaton	1 nap	Csü 10.08.12.	Csü 10.08.12.
21	Tavközveti akna emelése	8 nap	Hét 10.08.16.	Sze 10.08.25.
22	Térburkolat építése	2 nap	Hét 10.08.16.	Ked 10.08.17.
23	AC-11 kopóréteg építése	1 nap	Sze 10.08.18.	Sze 10.08.18.
24	AC-11 kopóréteg építése	2 nap	Ked 10.08.24.	Sze 10.08.25.
25	Jezőlábak kihelyezése	2 nap	Sze 10.08.24.	Csü 10.08.25.
26	Burkolati jelek festése	2 nap	Ked 10.08.24.	Sze 10.08.25.
27	Parkrendezés	2 nap	Ked 10.08.24.	Sze 10.08.25.
28	Felület rendezés	2 nap	Ked 10.08.24.	Sze 10.08.25.
29	Ceopak, kerékpárút (Sport utca és Ifjúság sétány)	29 nap	Hét 10.08.02.	Csü 10.09.09.
30	Organizációs terv	1 nap	Hét 10.08.02.	Hét 10.08.02.
31	Kresz tábák kihelyezése munka végéig	1 nap	Ked 10.08.03.	Ked 10.08.03.
32	Közveti szakelgőgyelet	1 nap	Ked 10.08.03.	Ked 10.08.03.
33	Tervezői művezetés	2 nap	Hét 10.08.02.	Ked 10.08.03.
34	Csapadékszaloma tisztítása	4 nap	Sze 10.08.04.	Hét 10.08.09.
35	Fakttermelés	2 nap	Hét 10.08.02.	Ked 10.08.03.
36	Bontás és építési törmelék elszállítása	3 nap	Hét 10.08.02.	Sze 10.08.11.
37	Humusz lezáródása	4 nap	Ked 10.08.10.	Pén 10.08.13.
38	Bevágás kialakítása	4 nap	Ked 10.08.10.	Pén 10.08.13.
39	Tomortítás földművön	4 nap	Ked 10.08.10.	Pén 10.08.13.
40	Tűkorkasztás	4 nap	Ked 10.08.10.	Pén 10.08.13.
41	Símtó hengertés	1 nap	Sze 10.08.11.	Sze 10.08.11.
42	Szegélyek bontása	3 nap	Csü 10.08.12.	Hét 10.08.16.
43	Kiemelt szegély építése	4 nap	Csü 10.08.12.	Ked 10.08.17.
44	Rácsos folyóka beépítése	11 nap	Hét 10.08.16.	Hét 10.08.30.
45	Kerítiszegélyépítése	3 nap	Ked 10.08.17.	Pén 10.08.20.
46	Talajjavító réteg készítése	8 nap	Pén 10.08.20.	Ked 10.08.31.
47	Szort alap készítése	8 nap	Ked 10.08.17.	Csü 10.08.26.
48	Faktorát építése	3 nap	Csü 10.08.26.	Hét 10.08.30.
49	Faktorát festése	2 nap	Pén 10.08.27.	Ked 10.08.31.
50	Víznyelők építése ledlappal	1 nap	Csü 10.09.02.	Csü 10.09.02.
51	CKI készítése	3 nap	Sze 10.09.01.	Pén 10.09.03.
52	Beton burkolatiap készítése	6 nap	Sze 10.09.01.	Sze 10.09.08.
53	Közműszerveknyelők emelése	1 nap	Ked 10.09.07.	Ked 10.09.07.
54	Térburkolat építése	2 nap	Sze 10.09.08.	Csü 10.09.09.
55	AC-8 felt. kopóréteg építése	2 nap	Csü 10.09.02.	Pén 10.09.03.
56	Burkolati jelek festése	2 nap	Csü 10.09.02.	Pén 10.09.03.
57	Parkrendezés	1 nap	Hét 10.09.06.	Hét 10.09.06.
58	Fűvetelés	1 nap	Csü 10.09.09.	Csü 10.09.09.
59	Keretfalatörés áthelyezése	1 nap	Csü 10.09.09.	Csü 10.09.09.
60	Megvalósítási terv készítése	1 nap	Csü 10.09.09.	Csü 10.09.09.
61				

Projekt: Üzemterv  
Dátum: Csü 10.07.01.

Összerfoglaltás  
Projekt összerfoglaltás

PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

1. RÉSZFELADAT: Csopek, Kerékpárút kivitelezése

1.	Előleg számla	A vállalkozói díj 11%-a	2010.08.02	3 536 405 Ft
2.	Végszámla	A vállalkozói díj 89%-a	2010.09.09	28 612 728 Ft
		3% tartalékkeret	2010.09.09	964 474 Ft

Összesen: 33 113 607 Ft

Veszprém, 2010. július 02.

HORNYÁK  
Szállítási és Szolgáltató Kft.  
8200 Veszprém, Bajcsy Zs. u. 12.  
Adószám: 11185417-2-11

*H. Cs.*

HORNYÁK KFT

*[Handwritten signatures]*

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. sz. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

név: **Csopak Község Önkormányzata  
Polgármesteri Hivatal**  
cím: 8229, Csopak, Petőfi Sándor utca 2.  
adóigazgatási szám: 15428701-2-19  
bankszámlaszám: 11748069-15428701-10120006  
képviseli: Ambrus Tibor polgármester, Dr. Szántód Anita jegyző

továbbiakban mint **Megrendelő**

másrészről

név: **Hornyák Szállítási és Szolgáltató Kft.**  
cím: 2890 Tata, Faller Jenő úti Ipartelep 2158/59.  
KSH. szám: 11185417-4941-113-11  
adóigazgatási szám: 111854-17-2-11  
bankszámlaszám: 10103623-46922300-01000007  
képviselik: Hornyák Csaba ügyvezető

továbbiakban mint **Vállalkozó**, együttes említés esetén **Felek**

között a mai napon és helyen az alábbiak szerint:

1. Felek rögzítik, hogy egymással közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2010. szeptember 1-én vállalkozási szerződést kötöttek „**A kerékpárosbarát település**” **KDOP 2.1.1/D-09-2009-0007 sz. projekt kivitelezése 1. részfeladat: kerékpárút kivitelezése** tárgyú projekt megvalósítására.
2. Tekintettel arra, hogy a felek a vállalkozási szerződést közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötötték meg, annak módosítása csak a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény 303.§-ában foglalt feltételek együttes fennállása esetén lehetséges.
3. A kivitelezés közben az alábbiakban részletezett, kivitelezést akadályozó a Vállalkozó érdekkörén kívül álló okok merültek fel:

- az E.ON Nyrt az eljárás lezárása után, a 2010. július 28-án érkezett R253/802/2010. számú levelében jelezte, hogy vezetékkiháltás szükséges



- a támogatási szerződés alapján a szállítói kifizetés ténye

- Ajánlatkérő élt azzal a lehetőséggel, hogy az építési beruházások esetében a szerződés az eredményhirdetés napjától számítva 60 napig köthető meg. Amennyiben ajánlattevő a munkákat most kezdené meg, úgy a kivitelezést várhatóan a téli időjárási körülmények között kellene lefolytatni.

4. Az előzőekben leírt körülmények miatt indokolt a vállalkozási szerződés módosítása:

5.

Szerződés pont	Eredeti szerződés tartalma	Módosítás tartalma
3.1.	A munkaterület átadásának határideje: <b>szerződéskötés napján</b>	A munkaterület átadásának határideje: <b>2010. október 15.</b>
3.2.	befejezési határidő: <b>2010. szeptember 09.</b>	befejezési határidő: <b>2011. április 30.</b>
5.4.	Az 1. részszámla (előlegszámla) benyújtására, akkor van lehetőség, amennyiben a nyertes ajánlattevő az ajánlatát, ennek figyelembevételével adta meg. A vég számla benyújtására a hiánymentes teljesítés után a műszaki átadási- átvételi jegyzőkönyv birtokában van lehetőség. A szerződés szerint hiány- és hibamentes teljesítést követően kiállított és igazolt számlát 30 napos átutalási határidővel egyenlíti ki a Kbt. 305. § (3) bekezdésére figyelemmel.	Az 1. részszámla (előlegszámla) benyújtására, akkor van lehetőség, amennyiben a nyertes ajánlattevő az ajánlatát, ennek figyelembevételével adta meg. A vég számla benyújtására a hiánymentes teljesítés után a műszaki átadási- átvételi jegyzőkönyv birtokában van lehetőség. A szerződés szerint hiány- és hibamentes teljesítést követően kiállított és igazolt számlát <b>szállítói kifizetéssel</b> egyenlíti ki a Kbt. 305. § (3) bekezdésére figyelemmel.  A szállítói kifizetés értelmében a pályázatban elszámolható költség önrész tartalmát a megrendelő utalja a vállalkozónak, a támogatás összegét a kifizető hatóság utalja közvetlenül a vállalkozó számlájára.

A befejezési határidő előtti teljesítés Megrendelő írásbeli engedélyéhez kötött.


6. A befejezési határidő változása szükségessé teszi a pénzügyi- műszaki ütemterv módosítását is.

7. A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal érvényben maradnak.

Szerződő Felek kijelentik, hogy a fenti, egymással szó szerint egyező, 4 példányban készült Vállalkozási szerződés módosítása\_1 elolvasták, annak tartalmát részükre megmagyarázták és azt megértették, majd a szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Kelt: Csopak 2010. 09 hó 08. nap

**HORNYÁK**  
Szállítási és Szolgáltató Kft.  
8200 Veszprém, Bajcsy Zs. u. 12.  
Adószám: 11185417-2-11




**Megrendelő**





**Vállalkozó**



## PÉNZÜGYI ÜTEMTERV

### 1. RÉSZFELADAT: Csopak, Kerékpárút kivitelezése

1.	Előleg számla	A vállalkozói díj 11%-a	2010.10.15	3 536 405 Ft
2.	Végszámla	A vállalkozói díj 89%-a	2011.04.30	28 612 728 Ft
		3% tartalékkeret	2011.05.01	964 474 Ft

**Összesen: 33 113 607 Ft**

**HORNYÁK**  
 Szállítási és Szoftvertámogató Kft.  
 8200 Veszprém, Bajcsy Zs. u. 12.  
 Adószám: 11185417-2-11

*H. G. Cs.*


**HORNYÁK KFT**

Veszprém, 2010. szeptember 08.

*[Handwritten signature]*

51

azonosító	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	Megelőzők	Ki 11.	'10. Okt. 18.	'10. Okt. 25.	'10. Nov. 01.	'10. Nov. 08.	'10. Nov. 15.	'10. Nov. 22.	'10. Nov. 29.
1	CSOPAK KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE	34 nap	Pén 10.10.15.	Sze 10.12.01.		S	C	P	P	S	V	H	K
2	Csopak, kerékpárút (Sport utca a 71-es út és Rozsi	34 nap	Pén 10.10.15.	Sze 10.12.01.		S	C	P	P	S	V	H	K
3	Idéjlenes forgalomkorlátozás	34 nap	Pén 10.10.15.	Sze 10.12.01.		S	C	P	P	S	V	H	K
4	"K" szegély építése	12 nap	Pén 10.10.15.	Hét 10.11.01.		S	C	P	P	S	V	H	K
5	AC-11 kötőréteg építése	3 nap	Csü 10.11.04.	Hét 10.11.08.	4BK+2 nap	S	C	P	P	S	V	H	K
6	AC-11 kopóréteg építése	2 nap	Ked 10.11.09.	Sze 10.11.10.	5	S	C	P	P	S	V	H	K

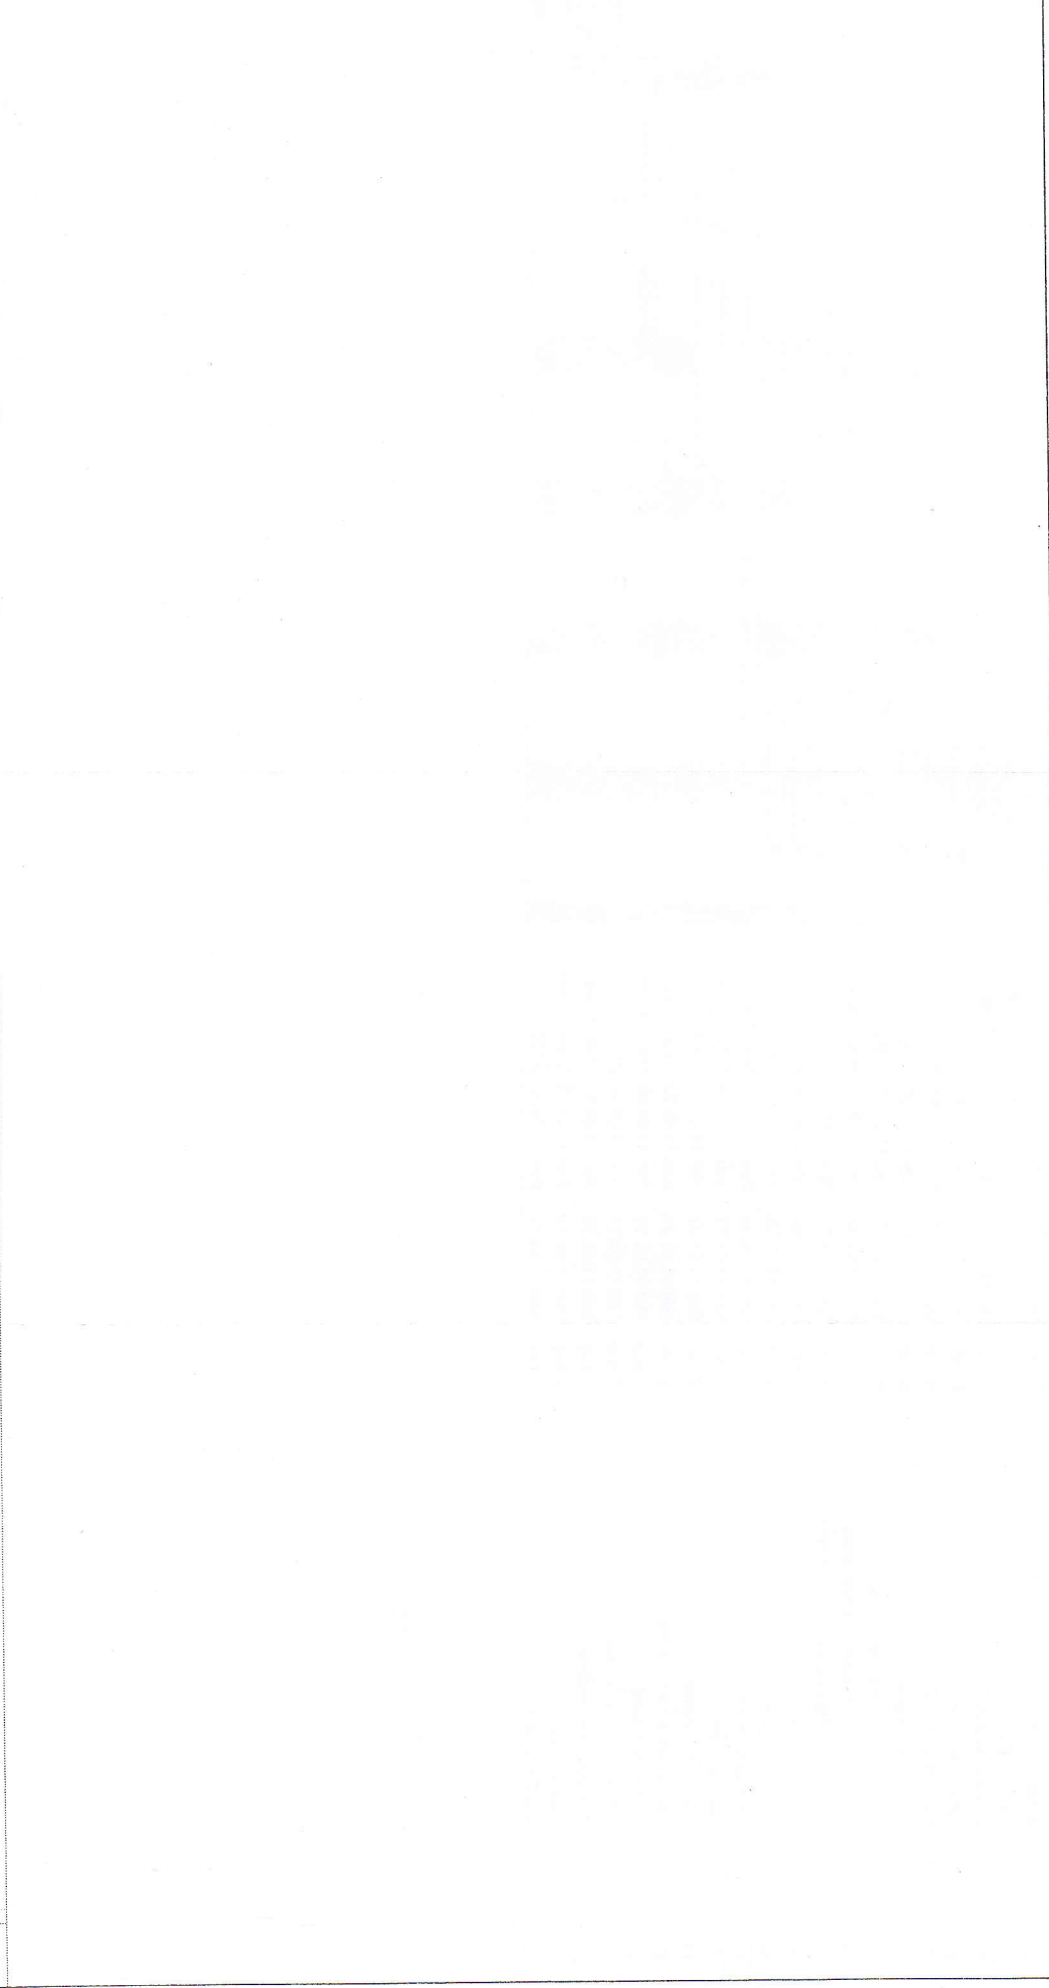


Tevékenység: Mértőldkő  
 Megszakítás: Összefoglalás  
 Végrehajtás: Projekt összefoglalása

Külső tevékenységek:   
 Külső mértőldkő:   
 Határidő:

Projekt: Ütemterv  
 Dátum: Csü 10.09.16.

1. oldal



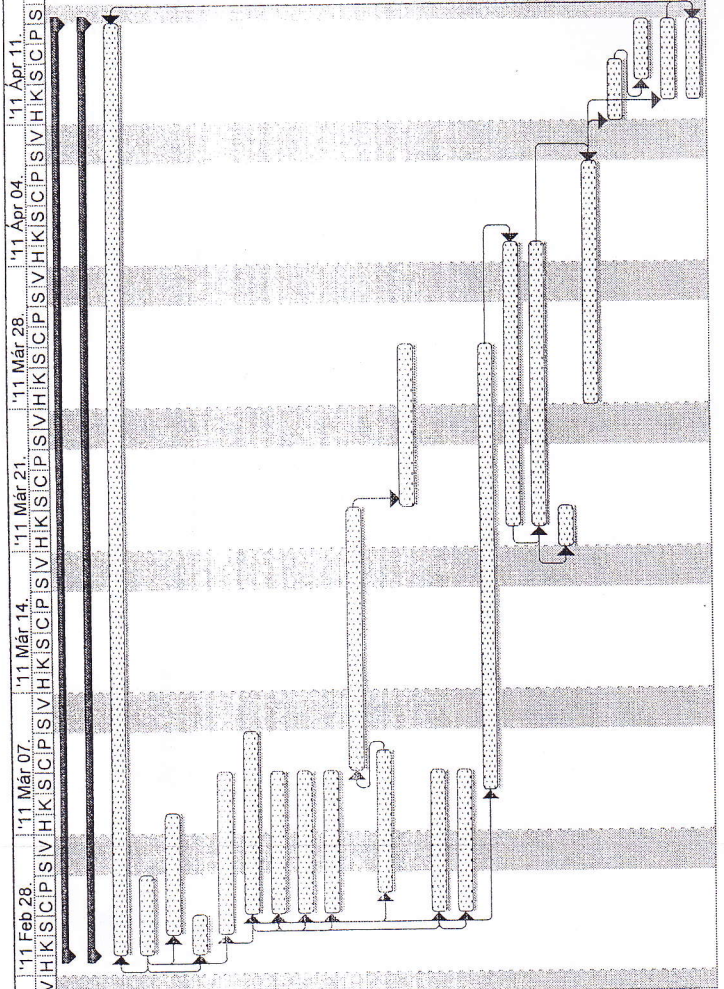


azonosító	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	Megelőzők
1	CSOPAK KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE	34 nap	Ked 11.03.01.	Pén 11.04.15.	
2	Csopak, kerékpárút (Sport utca a 71-es út és Rozmár utca között)	34 nap	Ked 11.03.01.	Pén 11.04.15.	1
3	Ideiglenes forgalomkorlátozás	34 nap	Ked 11.03.01.	Pén 11.04.15.	1
4	Faktormelés	4 nap	Ked 11.03.01.	Pén 11.03.04.	1
5	Tuskó kiszedése	4 nap	Sze 11.03.02.	Hét 11.03.07.	1
6	Bozót, csernye irtás	2 nap	Ked 11.03.01.	Sze 11.03.02.	1
7	Humusz leszedése	6 nap	Sze 11.03.02.	Sze 11.03.09.	1
8	Bevágás kialakítása	7 nap	Csü 11.03.03.	Pén 11.03.11.	1
9	Töltésszelésítés	5 nap	Csü 11.03.03.	Sze 11.03.09.	1
10	Tömörítés földművön	5 nap	Csü 11.03.03.	Sze 11.03.09.	1
11	Tömörítés töltésen	5 nap	Csü 11.03.03.	Sze 11.03.09.	1
12	Védőcső távközlési hálózathoz	9 nap	Csü 11.03.10.	Ked 11.03.22.	1
13	DRV elektromos védőcső elhelyezése	5 nap	Pén 11.03.04.	Csü 11.03.10.	1
14	Házi gázbevezetés védelemben elhelyezése	6 nap	Sze 11.03.23.	Sze 11.03.30.	1
15	Tűkorkészítés	5 nap	Csü 11.03.03.	Sze 11.03.09.	1
16	Símtó hengerlés	5 nap	Csü 11.03.03.	Sze 11.03.09.	1
17	Kerti szegélyépítése	16 nap	Sze 11.03.09.	Sze 11.03.30.	1
18	M22 készítése	10 nap	Ked 11.03.22.	Hét 11.04.04.	1
19	Tömörítés ágyazaton	10 nap	Ked 11.03.22.	Hét 11.04.04.	1
20	Távközlési akna emelése	2 nap	Hét 11.03.21.	Ked 11.03.22.	1
21	Térburkolat építése	10 nap	Hét 11.03.28.	Pén 11.04.08.	1
22	Jeizetőablak kihelyezése	3 nap	Hét 11.04.11.	Sze 11.04.13.	1
23	Burkolati jelek festése	3 nap	Sze 11.04.13.	Pén 11.04.15.	1
24	Padkarendezés	4 nap	Ked 11.04.12.	Pén 11.04.15.	1
25	Felület rendezés	4 nap	Ked 11.04.12.	Pén 11.04.15.	1

*[Handwritten signatures]*



Projekt: Ütemterv  
 Dátum: Csü 10.09.16.

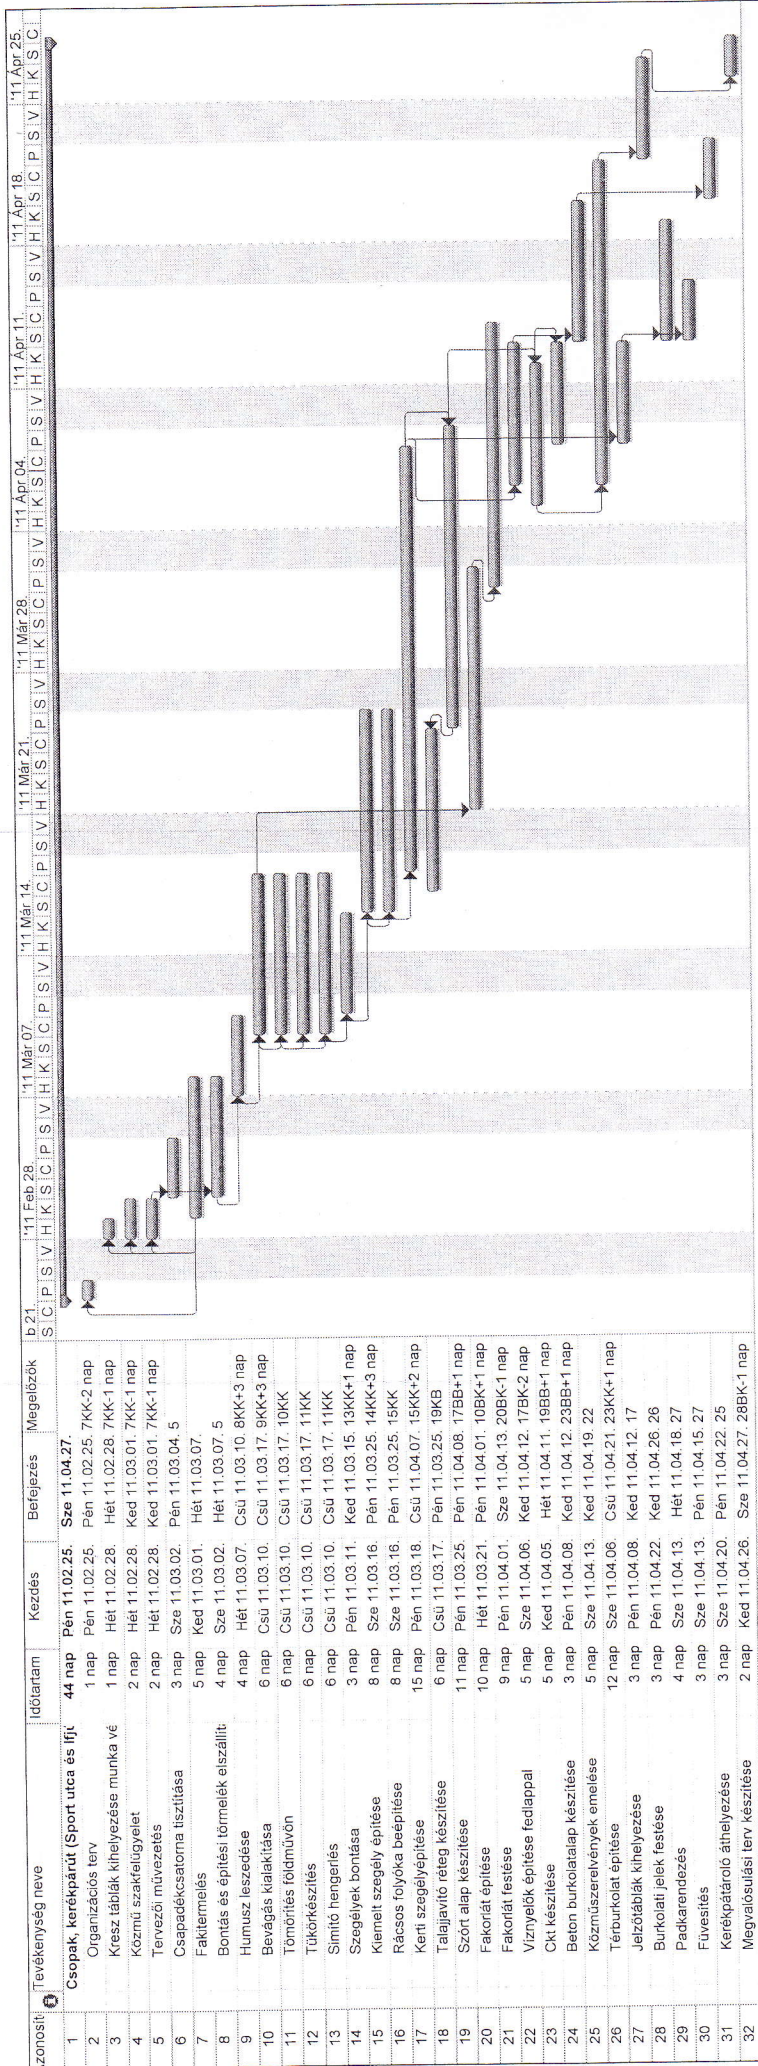

azonosító	Tevékenység neve	Időtartam	Kezdés	Befejezés	Megelőzők
1	Csopak, kerékpárút (Sport utca és Ifjt)	44 nap	Pén 11.02.25.	Sze 11.04.27.	
2	Organizációs terv	1 nap	Pén 11.02.25.	Pén 11.02.25.	7KK-2 nap
3	Kresz táblák kihelyezése munka vé	1 nap	Hét 11.02.28.	Hét 11.02.28.	7KK-1 nap
4	Közmű szakfelügyelet	2 nap	Hét 11.02.28.	Ked 11.03.01.	7KK-1 nap
5	Tervezői művezetés	2 nap	Hét 11.02.28.	Ked 11.03.01.	7KK-1 nap
6	Csapadekcsatorna tisztítása	3 nap	Sze 11.03.02.	Pén 11.03.04.5	
7	Fakitermelés	5 nap	Ked 11.03.01.	Hét 11.03.07.	
8	Bontás és építési törmelék elszállítás	4 nap	Sze 11.03.02.	Hét 11.03.07. 5	
9	Humusz levezetése	4 nap	Hét 11.03.07.	Csü 11.03.10.	8KK+3 nap
10	Bevágás kialakítása	6 nap	Csü 11.03.10.	Csü 11.03.17.	9KK+3 nap
11	Tömörítés földművön	6 nap	Csü 11.03.10.	Csü 11.03.17.	10KK
12	Tűkörkészítés	6 nap	Csü 11.03.10.	Csü 11.03.17.	11KK
13	Smitó hengerlés	6 nap	Csü 11.03.10.	Csü 11.03.17.	11KK
14	Szegélyek bontása	3 nap	Pén 11.03.11.	Ked 11.03.15.	13KK+1 nap
15	Kiemelt szegély építése	8 nap	Sze 11.03.16.	Pén 11.03.25.	14KK+3 nap
16	Rácsos folyóka beépítése	8 nap	Sze 11.03.16.	Pén 11.03.25.	15KK
17	Kerit szegélyépítése	15 nap	Pén 11.03.18.	Csü 11.04.07.	15KK+2 nap
18	Talajjavító réteg készítése	6 nap	Csü 11.03.17.	Pén 11.03.25.	19KB
19	Szórt alap készítése	11 nap	Pén 11.03.25.	Pén 11.04.08.	17BB+1 nap
20	Fakorlát építése	10 nap	Hét 11.03.21.	Pén 11.04.01.	10BK+1 nap
21	Fakorlát estése	9 nap	Pén 11.04.01.	Sze 11.04.13.	20BK-1 nap
22	Víznyelők építése redlappal	5 nap	Sze 11.04.06.	Ked 11.04.12.	17BK-2 nap
23	Ckt készítése	5 nap	Ked 11.04.05.	Hét 11.04.11.	19BB+1 nap
24	Beton burkolatlap készítése	3 nap	Pén 11.04.08.	Ked 11.04.12.	23BB+1 nap
25	Közműszervevények emelése	5 nap	Sze 11.04.13.	Ked 11.04.19.	22
26	Térburkolat építése	12 nap	Sze 11.04.08.	Csü 11.04.21.	23KK+1 nap
27	Jelzőláblák kihelyezése	3 nap	Pén 11.04.08.	Ked 11.04.12.	17
28	Burkolati jelek festése	3 nap	Pén 11.04.22.	Ked 11.04.26.	26
29	Padkarendezés	4 nap	Sze 11.04.13.	Hét 11.04.18.	27
30	Fűvesítés	3 nap	Sze 11.04.13.	Pén 11.04.15.	27
31	Keretpároló áthelyezése	3 nap	Sze 11.04.20.	Pén 11.04.22.	25
32	Megvalósítási terv készítése	2 nap	Ked 11.04.26.	Sze 11.04.27.	28BK-1 nap

Projekt: sport ifjúság ütemterv  
 Dátum: Hét 10.09.27.

Tevékenység Megszakiítás

Összefoglalás

Külső tevékenységek

Külső mérőföldök

Végrehajtás

Mérőföldök

Határidő

1. oldal

*[Handwritten signature]*
